



延昭
期和四年

牛件
昭和五年三月十五日返許可人
加波山鐵道株式會社
二月二十七日附申請工事竣功期限

月

大臣 日

裏面白紙

262


		加波山 鐵道工事		施設申請		期限延期ノ件
		(區間及哩程) 柿岡 高濱		一間		
		軌間 三呎 六吋	動力 蒸氣	九哩		
		建設費 八〇〇,〇〇〇圓		三四鎮		
免許年月日 大正四年六月		工事施行認可年月日 大正二年三月	本件原期	前同許可條件又ハ通牒		(備考)
(延期理由) 用地買収ニ莫外一日數々要シナルタム		工事着手年月日 大正二年三月	前同延期許可期限 (地方廳受理年月日) 大正四年三月	本件之間工程表 提出セリアリヤ		免許區間及哩程
今同延期申請期限		大正四年三月	大正四年三月	工程表(別紙ノ通)		工事認可區間及哩程
(申請期間) 五年		大正四年三月	大正四年三月	前同許可條件又ハ通牒		前同許可條件又ハ通牒
ケケ月月間(一五日) (一五日) (一六日) (一七日)						

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

監督局

長技術課長

(知事意見) 不得已モノト認ム

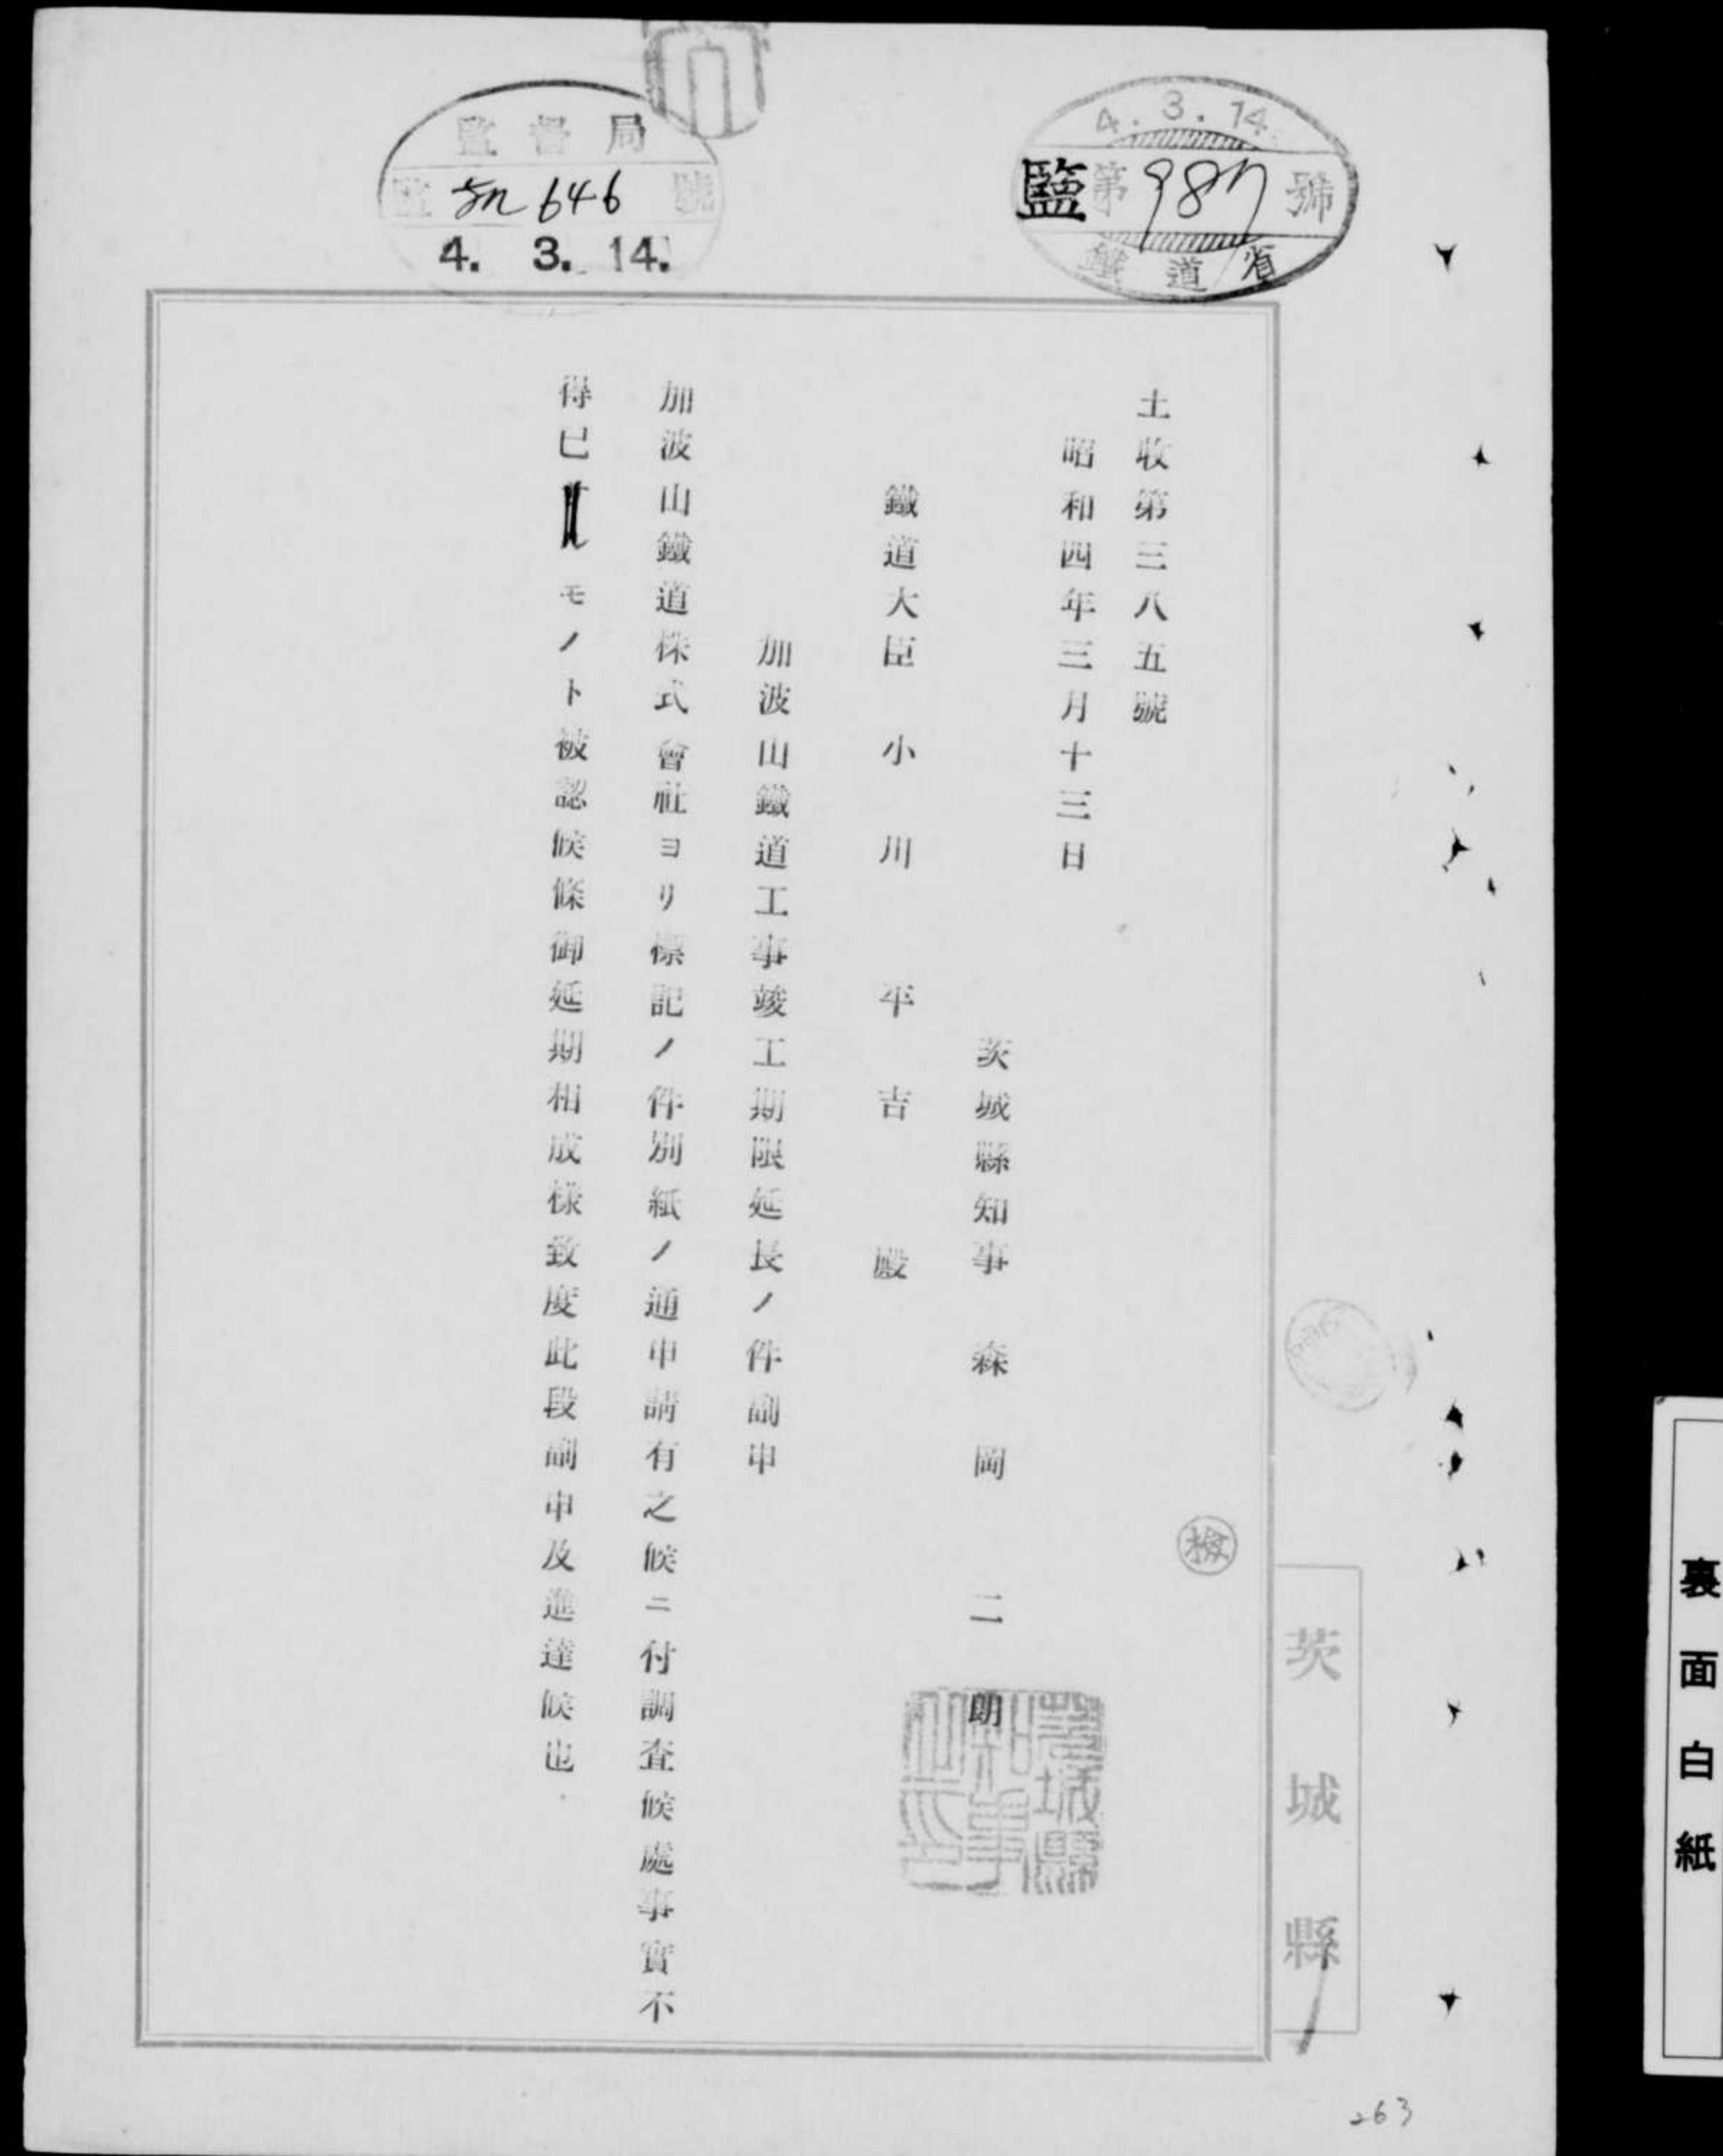

工事竣功期限延期許可申請書

縣城號
3月1日
昭和四年三月一〇日
付

156

工事竣工期限延期許可申請書

昭和貳年參月拾六日監第貳八號ヲ以テ工事施行
認可相受候處別紙理由ニ依リ指定期限迫ニ工事
竣功致候間特二昭和六年參月拾五日迄延期御許
可被成下度及申請候也

昭和四年貳月廿七日

新潟縣新潟郡高濱町大字高濱千四拾七番地四

加波山鐵道株式會社

常務取締役 皆川新之助

鐵道大臣 小川平吉殿

— 加波山鐵道株式會社

工事竣工延期許可申請理由書

工事着手以来工程進捗、廠用地ノ一部買収困難ニ
シテ文渉ニ意外ノ日數ヲ費シ其レガ爲メ一時工事中止
已ムナキニ至リ遺憾ナガラ延期申請ヲナス次第ナリ

以上

—加波山鐵道株式會社

番號

案

加波山鉄道社長

卷一百一十五

監督局長

第
六
號
昭和
四年
三月一
日
立
案
書印
及押
印者
合印

219

書印

合印

受領又一受命
淨者
校者

裏面あり

照會事項

模記 本年二月二十七日附以工事竣工期限延期件申請
事項子開 申請相成度
相應處右現在工程未送付相成度

昭和四年四月四日

加波山鐵道株式會社

常務取締役皆川新之助



鐵道省監督局長般

昭和四年四月一日附監軌第六四六號一ヲ以テ御照會
二相成候工程表別紙之通ノ提出仕り候也

— 加波山鐵道株式會社 —

件 2792
四。 4。 6。

高濱市間工程表

延長九哩參拏參錢零角 加波山鐵道

昭和四年參月參拏吉日現在

用 地	概 量	定期開城期始	現在城工歩合	才商 要
土 工	20段	10π	45	
構 築	9.24562 ²	10π	21.9	
軌 道		10π	5	
停車場	1所	10π	5	

加波山鐵道株式會社
